


伊士活停车场

2021年4月施工进度更新

以下项目即将开始施工：

- 安装钢筋、后张拉索和一层东侧板的浇注层管道。
- 一层东侧悬挂混凝土板采用浇注成型法，后张拉锁施加应力。
- 安装钢筋、后张拉索和二层西侧板的浇注层管道。
- 二层西侧悬挂混凝土板采用浇注成型法，后张拉锁施加应力。

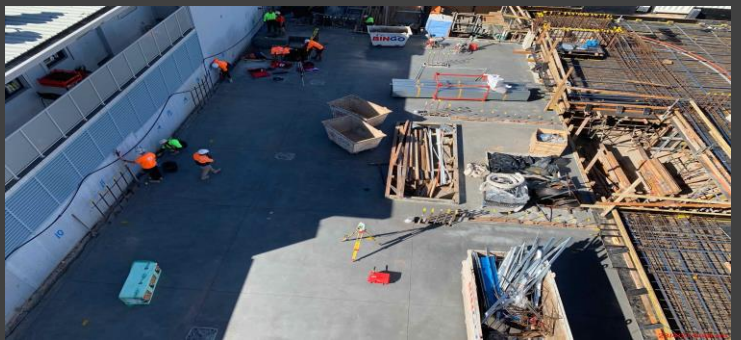

已完工项目：

- 地下管道安装完成。
- 东边界相邻建筑支撑柱完工。
- 混凝土结构基础完工。
- 地面层东侧混凝土板浇筑完工。
- 一层西侧悬挂混凝土板浇筑完工。
