


伊士活停车场

2021年6月施工进度更新

以下项目即将开始施工：

- 西侧水泥浇筑板施工平台收尾。
- 三层西侧板安装钢筋、后张拉索和的浇注层管道。
- 三层西侧悬挂混凝土板采用浇注成型法，后张拉锁施加应力。
- 三层东侧板安装钢筋、后张拉索和的浇注层管道。
- 三层东侧悬挂混凝土板浇注。
- 大楼永久性通电。

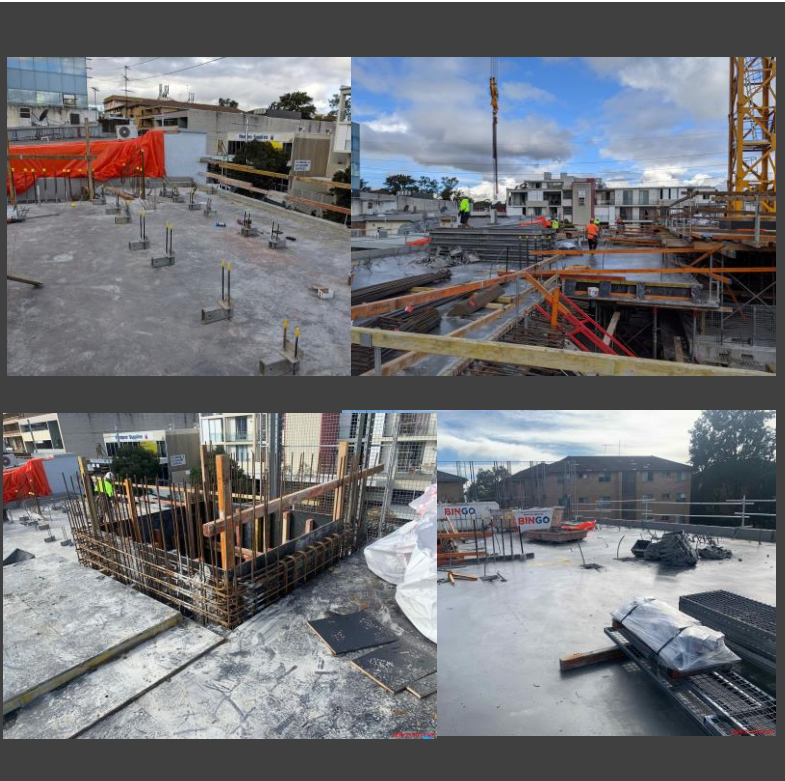

已完工项目：

- 二层西侧悬挂混凝土板安装钢筋、后张拉索和二层东侧板的浇注层管道。
- 二层东侧悬挂混凝土板浇筑成型、后张拉索初施加应力完成。
- 二层预浇混凝土板。
- 永久性通电相关电力管道安装。
